



Serviços de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara

RELATÓRIO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO


1. PLANILHA DE VALORES E PERCENTUAIS TOTAIS E DA 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES	16,90%	R\$ 33.896,85
2.0	SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA	52,71%	R\$ 105.745,99
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO	29,66%	R\$ 59.503,66
4.0	SERVIÇOS FINAIS	0,73%	R\$ 1.465,50
	TOTAL	100,00%	R\$ 200.612,00
	TOTAL ACUMULADO		

1a. MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
R\$ 11.185,96	33,00%	R\$ 11.451,83	33,78%
R\$ 31.723,80	30,00%	R\$ 16.729,56	15,82%
R\$ 5.950,37	10,00%	R\$ 52.984,71	89,04%
	-		-
R\$ 48.860,13	24,36%	R\$ 81.166,10	40,46%
R\$ 48.860,13	24,36%	R\$ 81.166,10	40,46%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	16/11/2016	0,00%	0,00%
0	23/12/2016	24,36%	0,00%
1	23/01/2017	60,58%	40,46%
2	23/02/2017	100,00%	
3	23/03/2017	100,00%	

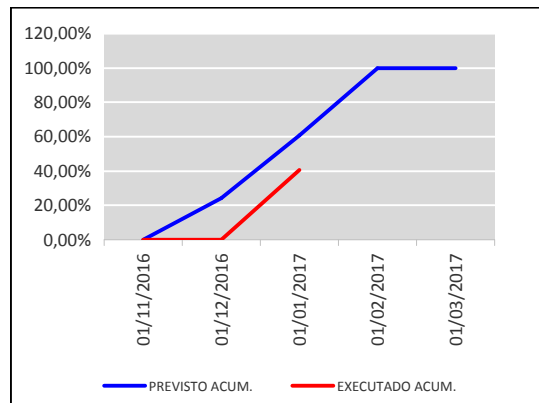

Fortaleza-CE, 23 de janeiro de 2017

(Handwritten Signature)
ATALIBA FONTINELE CARNEIRO
 Fiscal da Obra/Anal.Judiciário-engº
