





DIAGRAMAS DA OBRA – 11ª MEDIÇÃO


PREVISTO X EXECUTADO

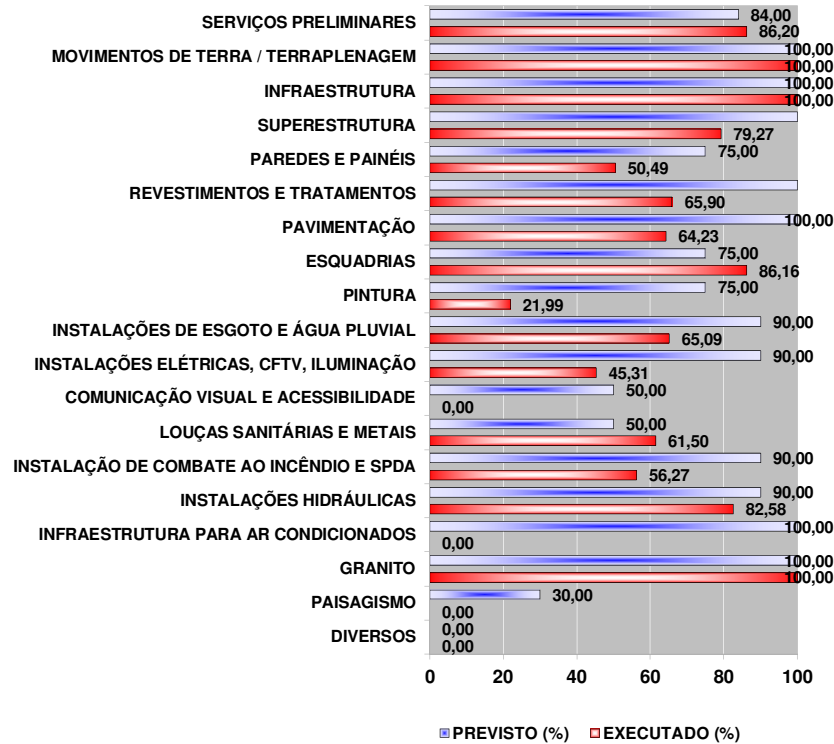

CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

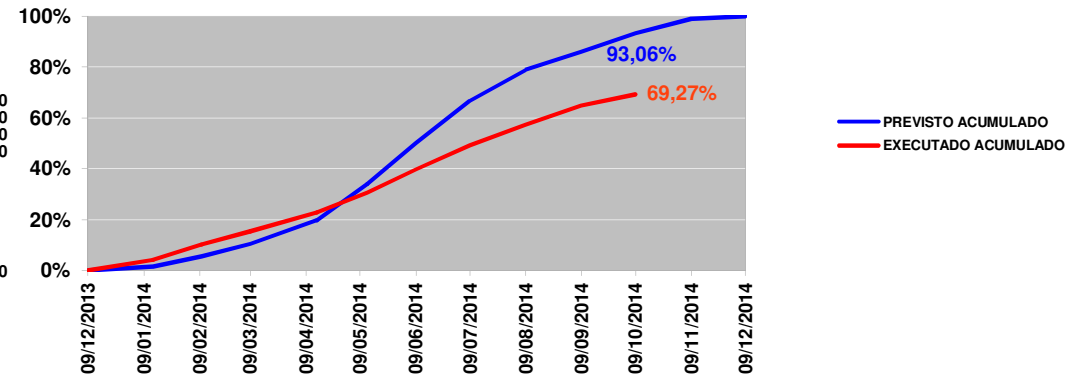

QUADRO DE EFETIVO

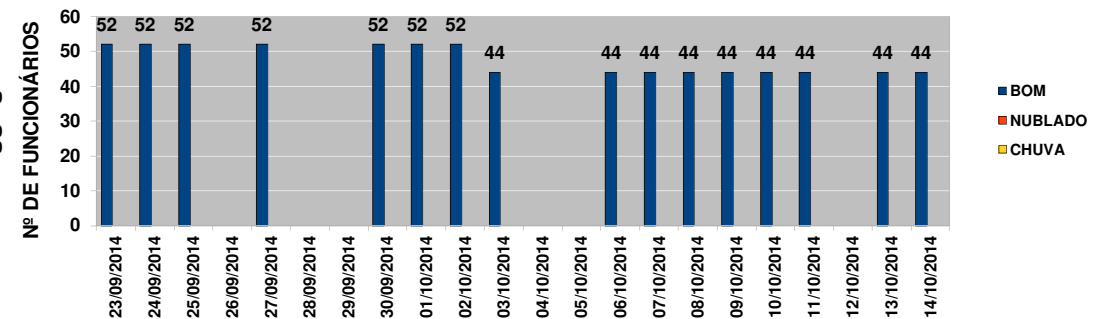





7 - ACESSO DOS JUIZES AS VARAS



8 - CALHA METÁLICA DA COBERTA



9 - CERÂMICA DA COPA



10 - PISO PORCELANATO



11 - TUBULAÇÃO DE DRENO CLIMATIZAÇÃO



12 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO

26/09/2014





19 - CERÂMICA DA ÁREA TÉCNICA



20 - SOLEIRA DAS ESCADAS

10.15.2014 14:19



21 - ELETROCALHAS VERTICAIS



22 - SOLEIRA DE GRANITO

10.15.2014 14:19



23 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO



24 - BANCADA DE GRANITO BANHEIRO





ATIVIDADES RELEVANTES EM EXECUÇÃO

- Conclusão do assentamento de cerâmica branca;
- A Fachada em ACM está em pleno desenvolvimento;
- Foram feitas as fixações dos guarda-corpos da escada metálica e da rampa de acesso;
- Foram concluídas as instalações de combate a incêndio;
- Está em execução a instalação elétrica, hidráulica, sanitária e de drenagem pluvial no pavimento Subsolo;
- Foi iniciado o assentamento das esquadrias de madeira, alumínio e vidro;
- As peças em granito continuam sendo assentadas em todos os ambientes molhados;

Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil John Kennedy V. de Araújo
Técnico Judiciário TRT7

Eng. Civil Gustavo Daniel G. Monteiro
Diretor da Divisão de Engenharia

26/09/2014
