



Serviços de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara

RELATÓRIO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO


1. PLANILHA DE VALORES E PERCENTUAIS TOTAIS E DA 2ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES	16,90%	R\$ 33.896,85
2.0	SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA	52,71%	R\$ 105.745,99
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO	29,66%	R\$ 59.503,66
4.0	SERVIÇOS FINAIS	0,73%	R\$ 1.465,50
	TOTAL	100,00%	R\$ 200.612,00
	TOTAL ACUMULADO		

SEGUNDA MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
R\$ 11.185,96	33,00%	R\$ 11.222,51	33,11%
R\$ 31.723,80	30,00%	R\$ 13.637,35	12,90%
R\$ 29.751,83	50,00%	R\$ 6.379,15	10,72%
R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	-
R\$ 72.661,59	36,22%	R\$ 31.239,01	15,57%
R\$ 72.661,59	36,22%	R\$ 112.405,11	56,03%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	16/11/2016	0,00%	0,00%
0	23/12/2016	24,36%	0,00%
1	23/01/2017	60,58%	40,46%
2	23/02/2017	100,00%	56,03%
3	23/03/2017	100,00%	

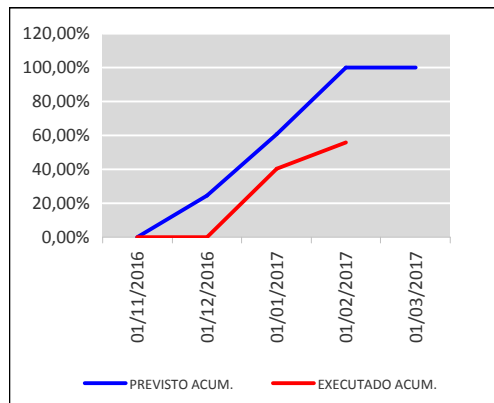

Fortaleza-CE, 23 de fevereiro de 2017

(Handwritten Signature)
ATALIBA FONTINELE CARNEIRO
 Fiscal da Obra/Anal.Judiciário-engº
