



**Serviços de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara**

**RELATÓRIO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO**


**1. PLANILHA DE VALORES E PERCENTUAIS TOTAIS E DA 3ª MEDIÇÃO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES	16,90%	R\$ 33.896,85
2.0	SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA	52,71%	R\$ 105.745,99
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO	29,66%	R\$ 59.503,66
4.0	SERVIÇOS FINAIS	0,73%	R\$ 1.465,50
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 200.612,00</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		

TERCEIRA MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
R\$ 11.185,96	33,00%	R\$ 7.855,75	23,18%
R\$ 31.723,80	30,00%	R\$ 19.407,56	18,35%
R\$ 29.751,83	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
<b>R\$ 72.661,59</b>	<b>36,22%</b>	<b>R\$ 27.263,31</b>	<b>13,59%</b>
<b>R\$ 72.661,59</b>	<b>36,22%</b>	<b>R\$ 112.405,11</b>	<b>69,62%</b>

**2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")**

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	16/11/2016	0,00%	0,00%
0	23/12/2016	24,36%	0,00%
1	23/01/2017	60,58%	40,46%
2	23/02/2017	100,00%	56,03%
3	23/03/2017	100,00%	69,62%
4			

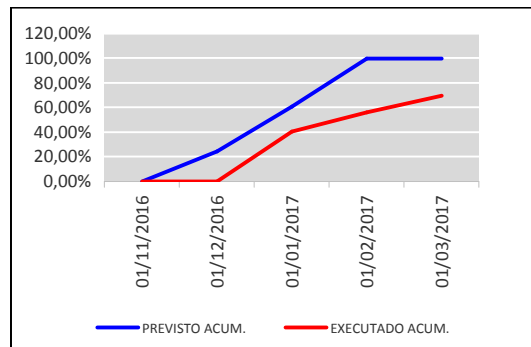

Fortaleza-CE, 23 de março de 2017

  
**ATALIBA FONTINELE CARNEIRO**  
 Fiscal da Obra/Anal.Judiciário-engº
