



Serviços de retirada de cerâmicas e sua substituição, nas fachadas externas e impermeabilização da laje Baú do 1º pavimento do Edifício Dom Helder Câmara


RELATÓRIO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO

1. PLANILHA DE VALORES E PERCENTUAIS TOTAIS E DA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL				QUINTA MEDIÇÃO			
		(%)	(R\$)	Valor Obra+Aditivo		Previsto		Executado	
				(%)	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ SERVIÇOS PRELIMINARES	16,90%	R\$ 33.896,85	26,85%	R\$ 67.564,38	R\$ 3.366,76	9,93%	R\$ 2.244,50	6,62%
2.0	SERVIÇOS DE RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE CERÂMICAS DA FACHADA	52,71%	R\$ 105.745,99	30,62%	R\$ 77.075,17	R\$ 55.971,52	52,93%	R\$ 22.473,87	21,25%
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE BAÚ DO 1º PAVIMENTO	29,66%	R\$ 59.503,66	34,54%	R\$ 86.915,18	R\$ 139,80	0,23%	R\$ 0,00	0,00%
4.0	SERVIÇOS FINAIS	0,73%	R\$ 1.465,50	0,81%	R\$ 2.045,25	R\$ 1.465,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0	ITENS NOVOS			7,18%	R\$ 18.075,82				
	TOTAL	100,00%	R\$ 200.612,00	92,83%	R\$ 251.675,80	R\$ 60.943,58	30,38%	R\$ 24.718,37	12,32%
	TOTAL ACUMULADO					R\$ 60.943,58	100,00%	R\$ 112.405,11	81,94%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVIS TO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	16/11/2016	0,00%	0,00%
0	23/12/2016	24,36%	0,00%
1	23/01/2017	60,58%	32,25%
2	23/02/2017	100,00%	44,66%
3	23/03/2017	100,00%	55,50%
4	24/04/2017	100,00%	65,32%
5	24/05/2017	100,00%	85,84
6	SALDO	100,00%	

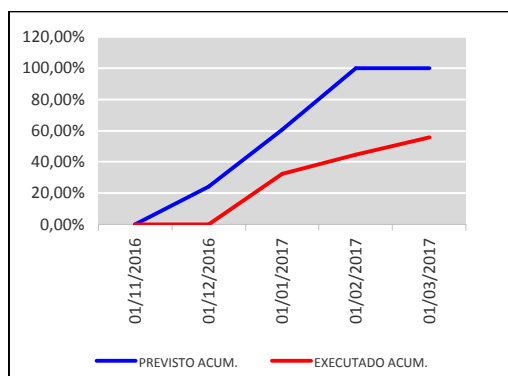

Fortaleza-CE, 24 de maio de 2017


ATALIBA FONTINELE CARNEIRO
 Fiscal da Obra/Anal.Judiciário-engº
