



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª. REGIÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA
OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO




1.0. RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	29.655,21
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,65%	633.756,42
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,30%	241.681,97
4.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	1,23%	90.305,04
5.0	ARQUITETURA	64,40%	4.719.168,23
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANTÁRIAS	3,82%	279.843,78
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,50%	549.629,07
8.0	REDE ESTRUTURADA E CFTV	0,57%	41.815,92
9.0	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES, SDAI, PÁRA-RAIOS)	1,99%	145.990,31
10.0	CONDICIONAMENTO DE AR	0,90%	66.104,21
11.0	LIMPEZA DA OBRA	0,09%	6.835,98
12.0	ITENS NOVOS (SPRINKLERS, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PRÉDIOS)	7,14%	522.827,02
	TOTAL	100,00%	7.327.613,16
	TOTAL ACUMULADO		

14a. MEDIÇÃO			
PREVISTO		EXECUTADO	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
	-		-
-	-		-
	-		-
	-		-
-	-	84.684,30	1,79
	-		-
	-	54,24	0,01
	-		-
	-	2.034,62	1,39
	-		-
-	-	6.835,98	100,00
	-	32.068,99	6,13
-	0,00%	125.678,13	1,72%
6.942.319,96	94,74%	7.327.613,16	100,00%


2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	23/02/2015	0,00%	0,00%
1	23/03/2015	1,74%	2,54%
2	23/04/2015	4,01%	4,41%
3	23/05/2015	7,47%	12,49%
4	01/07/2015	18,97%	19,46%
5	07/08/2015	29,95%	32,71%
6	11/09/2015	41,58%	46,22%
7	08/10/2015	52,41%	58,42%
8	06/11/2015	63,24%	68,76%
9	01/12/2015	73,03%	77,77%
10	12/01/2016	81,70%	80,68%
11	17/02/2016	90,07%	91,81%
12	16/03/2016	94,74%	94,63%
13	05/04/2016	94,74%	98,28%
14	18/04/2016	94,74%	100,00%

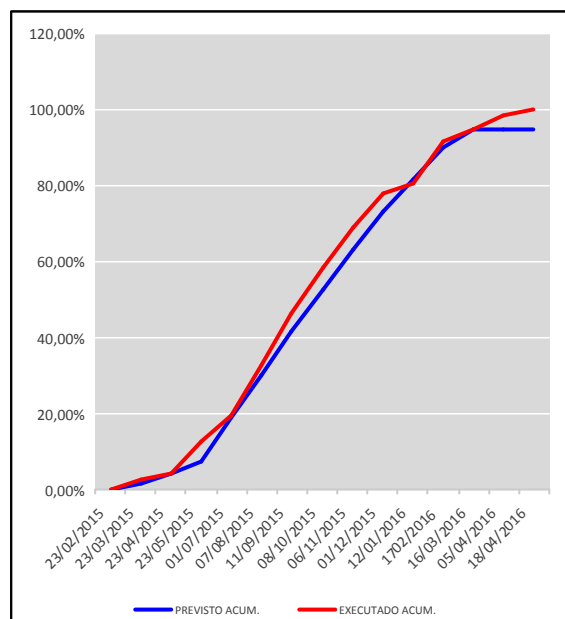


3.0 FOTOGRAFIAS

- a) Vista panorâmica da sala de espera, inclusive sinalização podotátil de borracha, hidrantes, evaporadoras do sistema de ar-condicionado, detectores de fumaça, acabamentos de paredes, esquadrias e roda-meios e sinalização de incêndio.

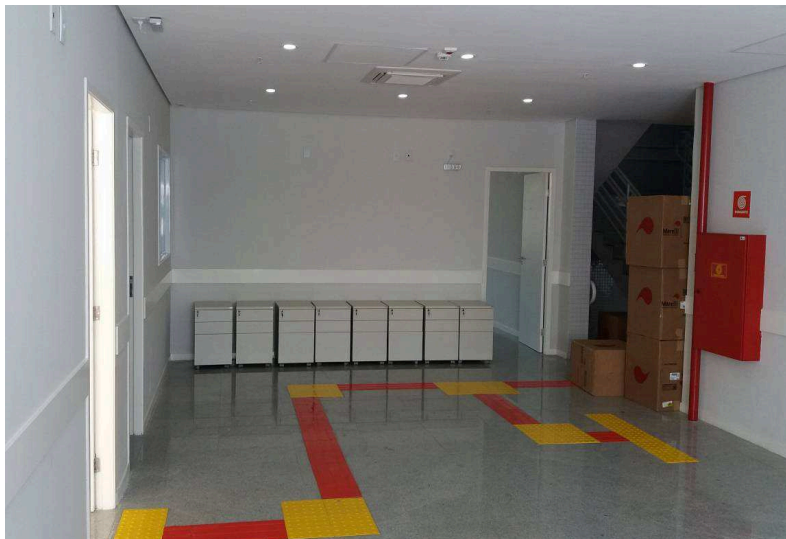


- b) Vista panorâmica de uma sala de audiências, inclusive acabamentos de paredes e forro, sinalização de emergência, iluminação fluorescente e detectores de fumaça.

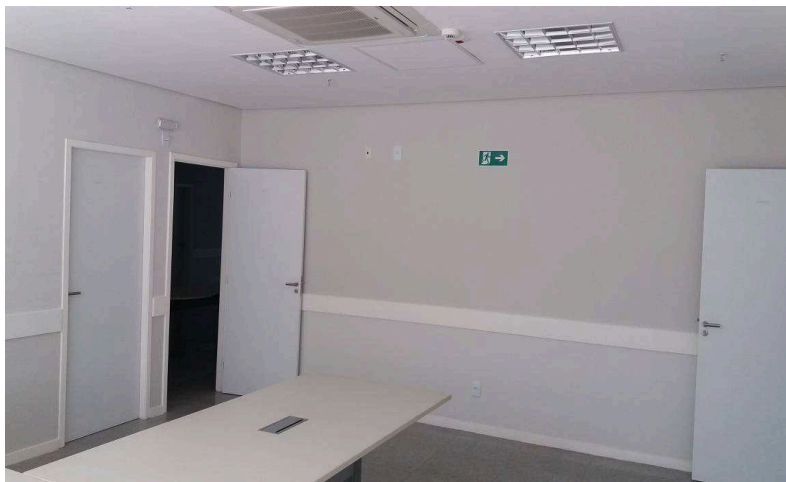

- c) Vista panorâmica do hall de entrada no pavimento térreo, inclusive piso em granito, sinalização podotátil de borracha, hidrante e sinalização de emergência. À esquerda, maquete do prédio.




- d) Vista interna da passarela metálica de interligação entre os prédios do Complexo do Fórum Autran Nunes: forro emassado e pintado, esquadrias em vidro temperado, corrimãos metálicos pintados e piso em chapas de aço galvanizado pintado.

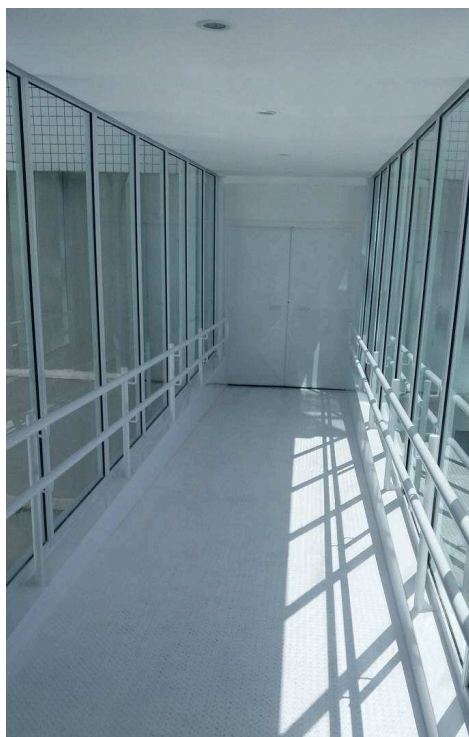


- e) Detalhe dos corrimãos de aço pintados com tinta esmalte instalados nas escadas centrais do prédio. Por tratar-se de um imóvel antigo, a saída de emergência se dará também por estas escadas.




- f) Vista interna de um dos banheiros: acabamentos de todas as paredes em porcelanato, divisórias e bancadas em granito, portas revestidas com PVC, louças, espelhos e acessórios devidamente instalados.

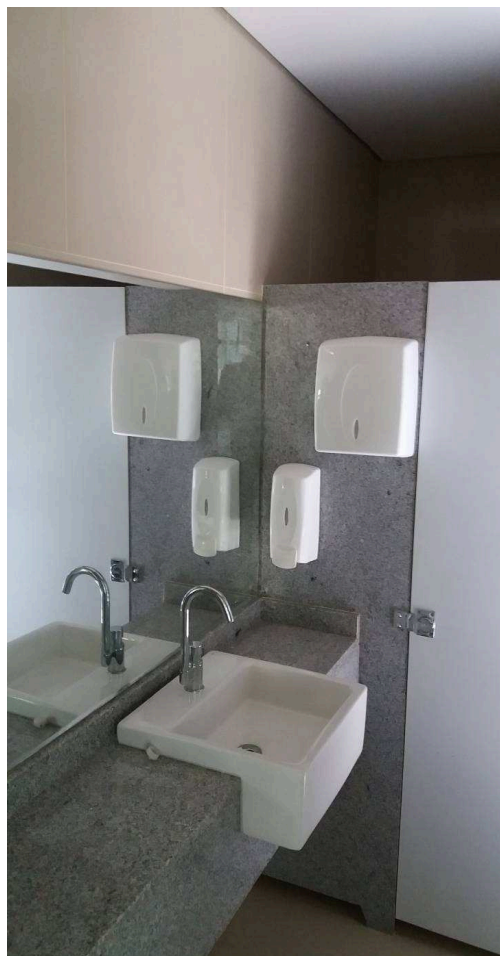


- g) Vista interna da pele de vidro que compõe a fachada principal do prédio.

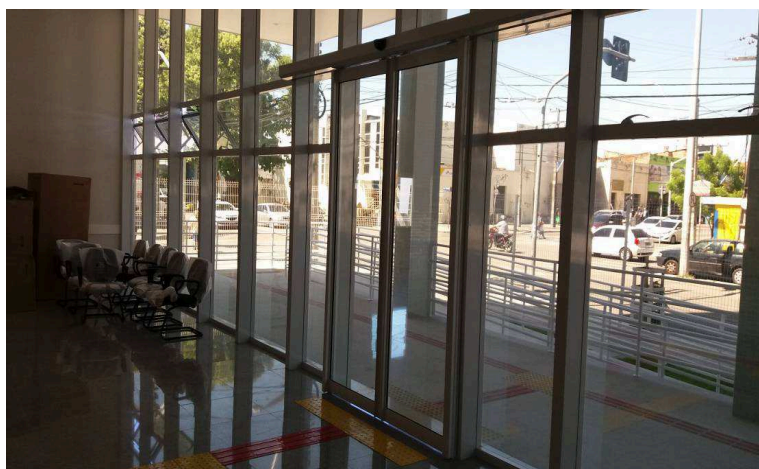


- h) Vista externa da pele de vidro que compõe a fachada principal do prédio, inclusive forro em ACM, piso em granito flameado e sinalização podotátil em concreto.

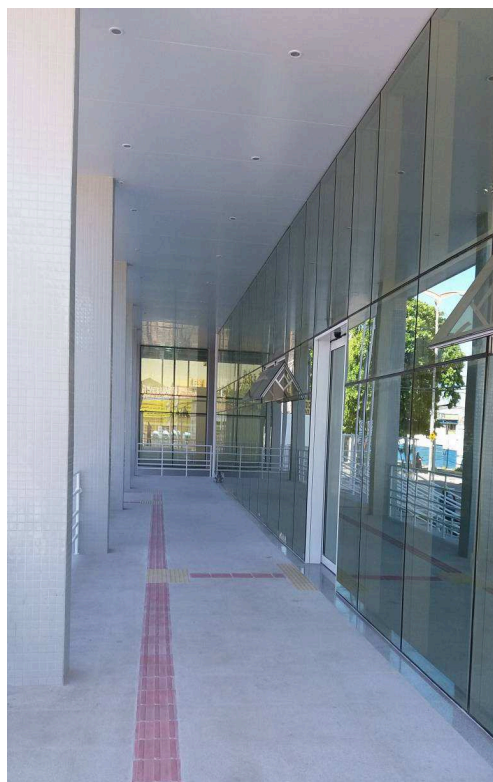


- i) Detalhe da rampa de acesso a PPNEs, inclusive piso em granito flameado e corrimãos metálicos pintados.

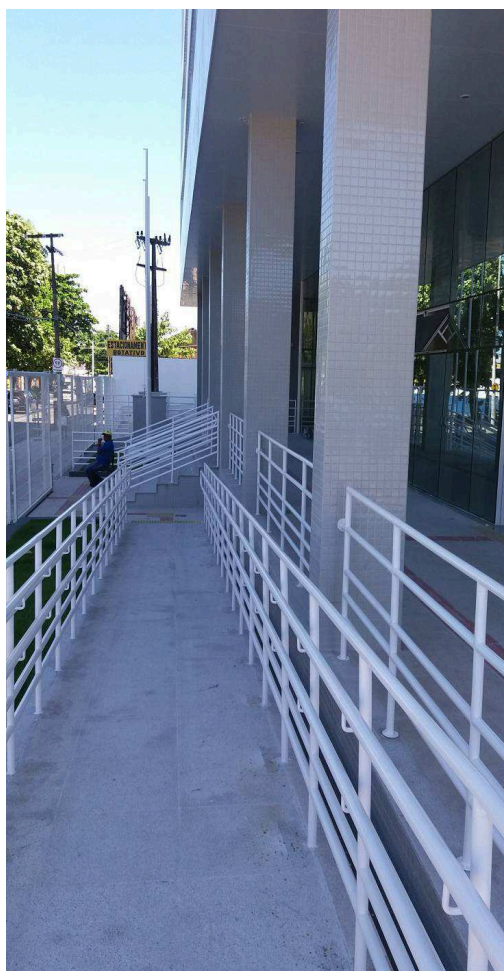


- j) Detalhe do gradil instalado no perímetro da edificação, inclusive pavimento de blocos intertravados e sinalização podotátil de concreto.

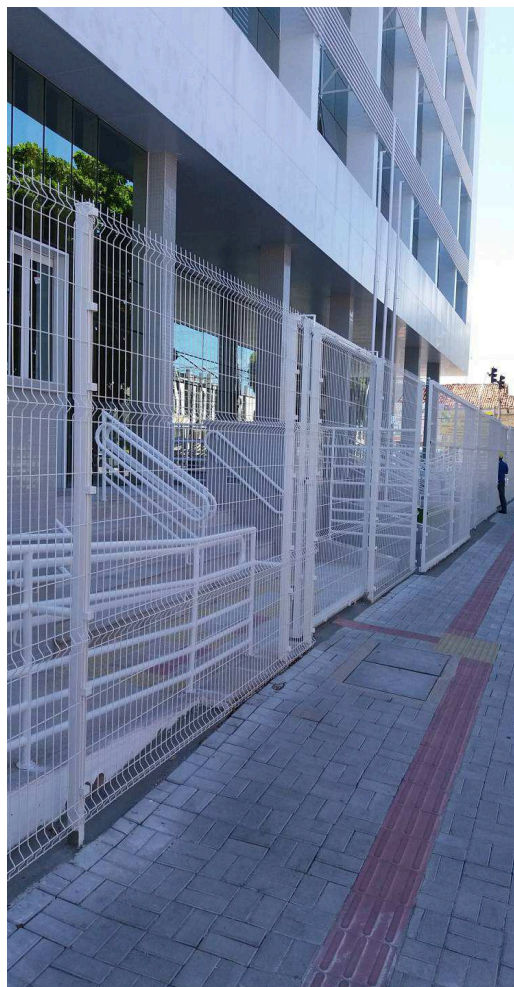

- l) Detalhe do pátio externo do lado oeste, inclusive revestimentos cerâmicos da fachada lateral do prédio, corrimãos da rampa de acesso à futura agência bancária e bicicletário instalado.

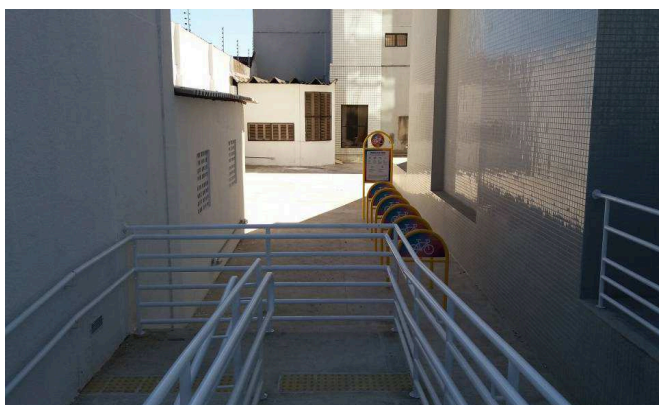

- m) Detalhe do gradil instalados no perímetro da edificação, inclusive pavimento de blocos intertravados, sinalização podotátil de concreto, grama natural plantada e mastros.

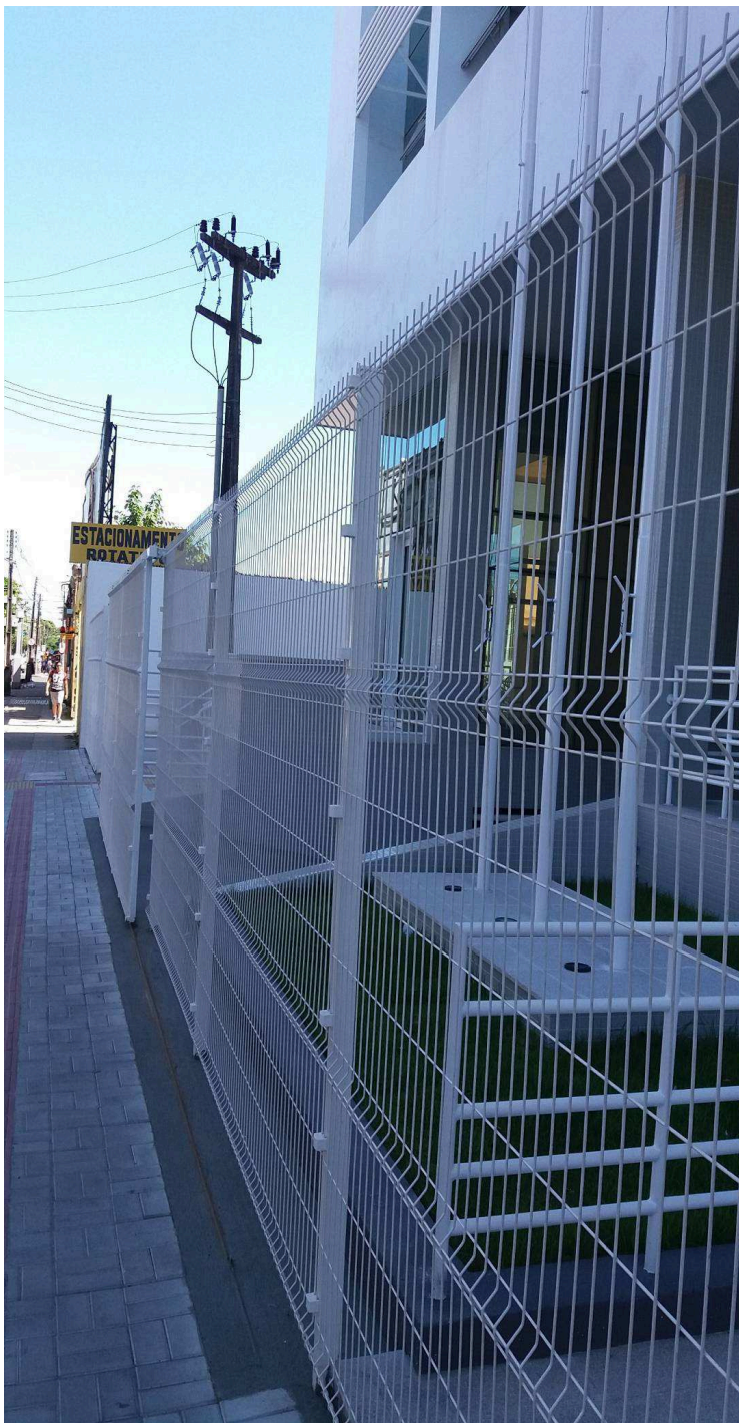



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª. REGIÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA
OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO



n) Vista panorâmica de toda a obra entregue.

