



**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**


1.0. RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	29.655,21
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,13%	633.960,74
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,64%	252.958,35
4.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	1,30%	90.305,04
5.0	ARQUITETURA	67,25%	4.668.757,26
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANTÁRIAS	4,03%	279.843,78
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,82%	542.998,82
8.0	REDE ESTRUTURADA E CFTV	0,59%	40.651,04
9.0	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES, SDAI, PÁRA-RAIOS)	1,76%	122.007,58
10.0	CONDICIONAMENTO DE AR	3,95%	274.346,16
11.0	LIMPEZA DA OBRA	0,10%	6.835,98
	TOTAL	100,00%	6.942.319,96
	TOTAL ACUMULADO		

2a. MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
	-		-
52.301,76	8,25	53.513,75	8,44
84.235,13	33,30	75.460,39	29,83
30.071,58	33,30		-
	-	8.356,63	0,18
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
166.608,47	2,40%	137.330,77	1,98%
294.106,08	4,24%	323.374,60	4,66%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	23/02/2015	0,00%	0,00%
1	23/03/2015	1,84%	2,68%
2	23/04/2015	4,24%	4,59%
3	23/05/2015	7,89%	13,18%
4	23/06/2015		
5	23/07/2015		
6	23/08/2015		
7	23/09/2015		
8	23/10/2015		
9	23/11/2015		
10	23/12/2015		
11	23/01/2016		
12	23/02/2016		

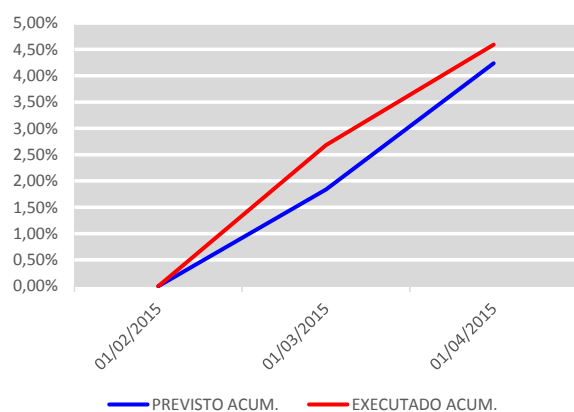

3.0 FOTOGRAFIAS

a) Demolições e retiradas diversas.





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

b) Demolições e retiradas diversas.



c) Execução de fechamentos de vão, execução de vergas e contravergas.



d) Execução de fechamentos de vão, execução de vergas e contravergas.





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

- e) Análise da viabilidade de manutenção do revestimento existente através de ensaio/teste de arrancamento.



- f) Execução de fechamentos de vão, execução de vergas e contravergas.



- g) Execução de fechamentos de vão, execução de vergas e contravergas.





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

h) Execução de fechamentos de vão, execução de vergas e contravergas.



i) Execução de fechamentos de vão, execução de vergas e contravergas.



j) Demolições e retiradas diversas.



