



**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**


1.0. RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARE	0,40%	29.655,21
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBR.	8,65%	633.756,42
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	3,30%	241.681,97
4.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃ	1,23%	90.305,04
5.0	ARQUITETURA	64,40%	4.719.168,23
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANTÁRIAS	3,82%	279.843,78
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,50%	549.629,07
8.0	REDE ESTRUTURADA E CFT	0,57%	41.815,92
9.0	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES, SDAI, PÁRA-RAIOS	1,99%	145.990,31
10.0	CONDICIONAMENTO DE AF	0,90%	66.104,21
11.0	LIMPEZA DA OBR	0,09%	6.835,98
12.0	ITENS NOVOS (SPRINKLERS, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PRÉDIOS)	7,14%	522.827,02
	TOTAL	100,00%	7.327.613,16
	TOTAL ACUMULADO		

6a. MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
	-		-
52.301,76	8,25	60.033,98	9,47
	-	48.133,15	19,92
	-		-
548.578,98	11,62	662.553,91	14,04
81.154,70	29,00	7.793,39	2,78
89.594,81	16,30	37.779,15	6,87
	-		-
12.200,76	8,36	4.461,03	3,06
68.586,54	103,76		-
	-		-
	-	168.610,08	32,25
852.417,54	11,63%	989.364,69	13,50%
3.046.983,86	41,58%	3.386.588,64	46,22%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	23/02/15	0,00%	0,00%
1	23/03/15	1,74%	2,54%
2	23/04/15	4,01%	4,59%
3	23/05/15	7,47%	12,49%
4	01/07/15	18,97%	19,46%
5	07/08/15	29,95%	32,71%
6	11/09/15	41,58%	46,22%
7	23/09/15		
8	23/10/15		
9	23/11/15		
10	23/12/15		
11	23/01/16		
12	23/02/16		

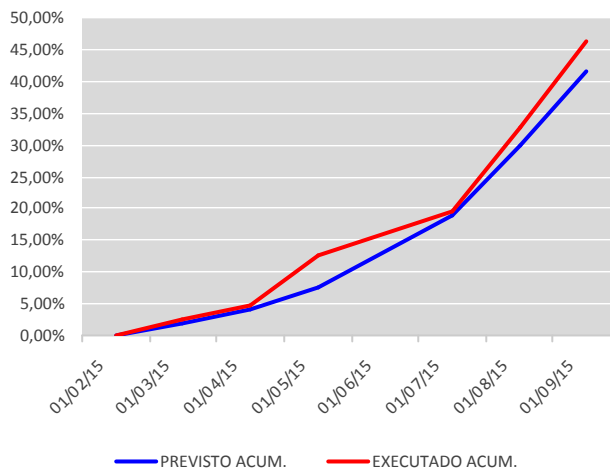



OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)

3.0 FOTOGRAFIAS


a) Isolamento Acústico Divisória em Gesso Acartonado



b) Instalação dos Quadros Elétricos



c) Execução de Bancada de Granito e Divisória dos Banheiros

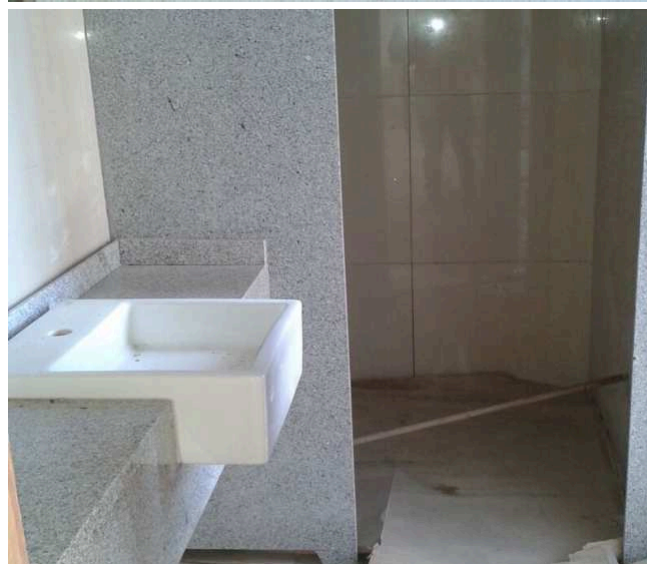




**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

d) Execução de Balcão de Granito nas área Secretaria



e) Divisória em Gesso Acartonado

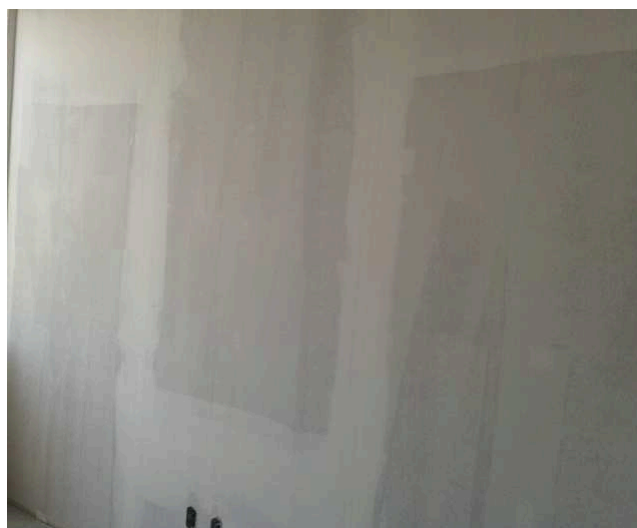

f) Execução de Balcão de Granito do Restaurante





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

g) Execução de Bancada de Granito e Divisória dos Banheiros



h) Andaimos fachadeiros e execução de Revestimento em ACM na Fachada




i) Andaimos fachadeiros com tela de Proteção





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

j) Execução de Pele de Vidro na fachada

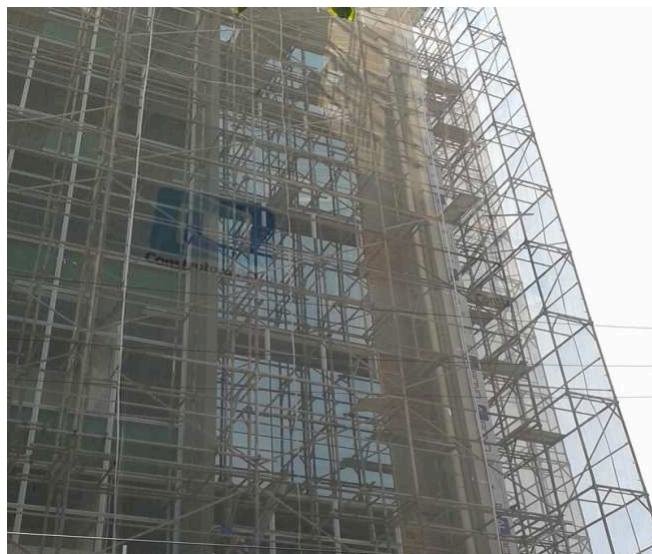

l) Execução de Pele de Vidro na fachada



m) Execução de Pele de Vidro na fachada





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

n) Execução de manta Asfáltica Cobertura



o) Execução de manta Asfáltica Cobertura



p) Execução Pastilha na Fachada Principal





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

q) Execução Pastilha nos Pilares da Entrada



r) Execução Pastilha da Caixa D'água



s) Execução de Tubulações do SDAI (Incêndio)





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

t) Execução de Tubulações do SPRINKLERS (Incêndio)

