



**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**


1.0. RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARE	0,40%	29.655,21
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBR	8,65%	633.756,42
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	3,30%	241.681,97
4.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃ	1,23%	90.305,04
5.0	ARQUITETURA	64,40%	4.719.168,23
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANTÁRIAS	3,82%	279.843,78
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	7,50%	549.629,07
8.0	REDE ESTRUTURADA E CFT	0,57%	41.815,92
9.0	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES, SDAI, PÁRA-RAIOS)	1,99%	145.990,31
10.0	CONDICIONAMENTO DE AR	0,90%	66.104,21
11.0	LIMPEZA DA OBR	0,09%	6.835,98
12.0	ITENS NOVOS (SPRINKLERS, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PRÉDIOS)	7,14%	522.827,02
	TOTAL	100,00%	7.327.613,16
	TOTAL ACUMULADO		

7a. MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
	-		-
52.301,76	8,25	60.033,98	9,47
	-	636,91	0,26
	-		-
548.578,98	11,62	616.021,06	13,05
	-	33.439,46	11,95
89.594,81	16,30	39.378,71	7,16
10.162,76	24,30	3.051,81	7,30
24.401,52	16,71	13.043,87	8,93
68.586,54	103,76		-
	-		-
	-	128.492,76	24,58
793.626,36	10,83%	894.098,56	12,20%
3.046.983,86	52,41%	3.386.588,64	58,42%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	23/02/2015	0,00%	0,00%
1	23/03/2015	1,74%	2,54%
2	23/04/2015	4,01%	4,41%
3	23/05/2015	7,47%	12,49%
4	01/07/2015	18,97%	19,46%
5	07/08/2015	29,95%	32,71%
6	11/09/2015	41,58%	46,22%
7	08/10/2015	52,41%	58,42%
8	23/10/2015		
9	23/11/2015		
10	23/12/2015		
11	23/01/2016		
12	23/02/2016		

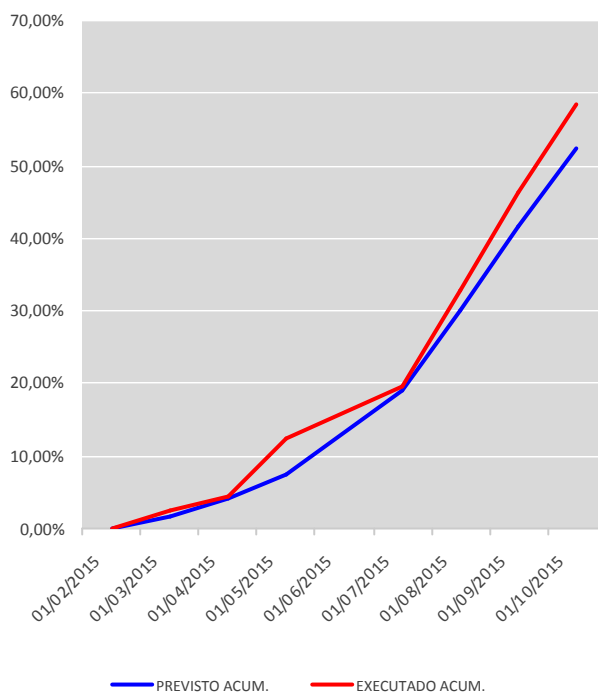



**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

3.0 FOTOGRAFIAS

a) Aplicação de Selador para Pintura na Divisórias



b) Isolamento Termo/Acústico da porta de Ar condicionado



c) Porta Acústica da Sala de Ar Condicionado





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

d) Bancada de Granito dos Wc`s



e) Impermeabilização com manta asfáltica no térreo



f) Isolamento Termo/Acústico na Cobertura





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**


g) Porta veneziana em Alumínio para SHAFT



h) Instalação dos Wcs deficientes



i) Instalação dos Wcs deficientes

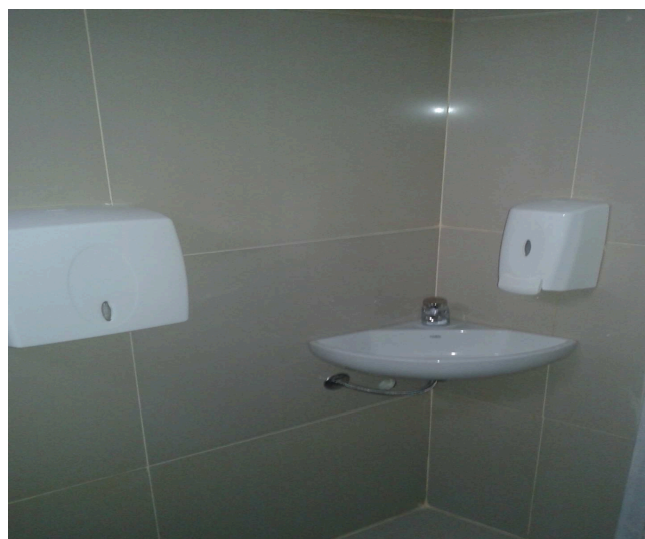




**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

j) Bacadas de Banheiros



l) Instalação das janelas Veneziana das salas de Ar Condicionado

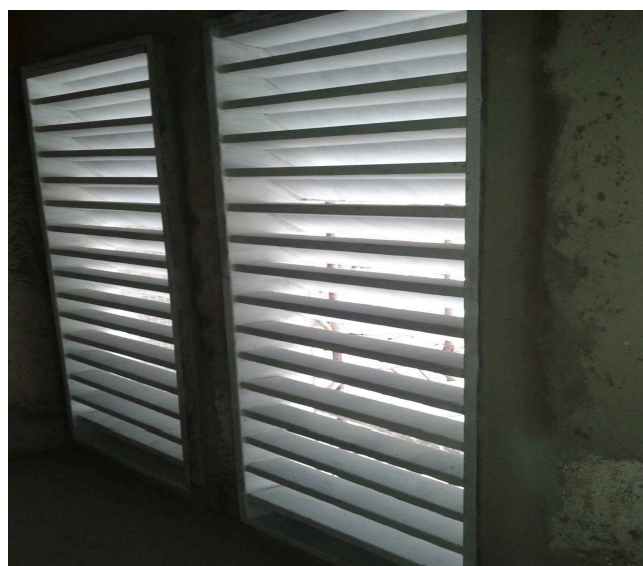

m) Revestimento em Pastilha da Fachada E2





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

n) Balcão interno da Cozinha 4º Pavimento



o) Revestimento da Cozinha e instalação do Balcão 4º Pavimento



p) Instalação PELE DE VIDRO fachada E1






**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

q) Instalação ACM na Fachada E3



r) Instalação PELE DE VIDRO fachada E1

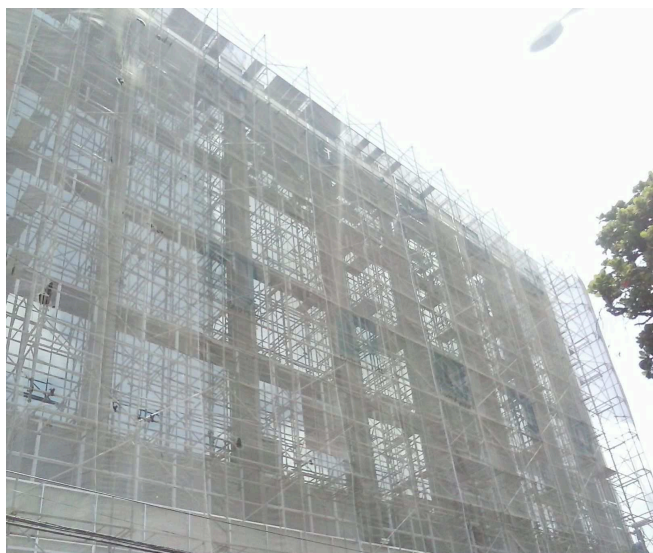

s) Instalação PELE DE VIDRO fachada E2





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

t) Instalação ACM na Fachada E4

