



**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**


1.0. RELATÓRIO DE MEDIÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	
		(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARE	0,40%	29.655,21
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBR	8,65%	633.756,42
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	3,30%	241.681,97
4.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃ	1,23%	90.305,04
5.0	ARQUITETURA	64,40%	4.719.168,23
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANTÁRIAS	3,82%	279.843,78
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,50%	549.629,07
8.0	REDE ESTRUTURADA E CFT	0,57%	41.815,92
9.0	COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES, SDAI, PÁRA-RAIOS)	1,99%	145.990,31
10.0	CONDICIONAMENTO DE AR	0,90%	66.104,21
11.0	LIMPEZA DA OBR	0,09%	6.835,98
12.0	ITENS NOVOS (SPRINKLERS, INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PRÉDIOS)	7,14%	522.827,02
	TOTAL	100,00%	7.327.613,16
	TOTAL ACUMULADO		

9a. MEDIÇÃO			
Previsto		Executado	
(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
	-		-
52.301,76	8,25	42.632,02	6,73
	-	86,87	0,04
	-	1.654,09	1,83
548.578,98	11,62	317.087,01	6,72
	-	117.916,43	42,14
47.512,40	8,64	47.892,12	8,71
10.162,76	24,30	1.422,62	3,40
24.401,52	16,71	82.224,31	56,32
34.293,27	51,88		-
	-		-
	-	49.603,71	9,49
717.250,68	9,79%	660.519,18	9,01%
5.351.487,26	73,03%	5.698.793,01	77,77%

2.0 CURVA DE PROGRESSO FÍSICO (CURVA "S")

MEDIÇÃO		PREVISTO ACUM.	EXECUTADO ACUM.
Nº	DATA APROX.		
Início	23/02/2015	0,00%	0,00%
1	23/03/2015	1,74%	2,54%
2	23/04/2015	4,01%	4,41%
3	23/05/2015	7,47%	12,49%
4	01/07/2015	18,97%	19,46%
5	07/08/2015	29,95%	32,71%
6	11/09/2015	41,58%	46,22%
7	08/10/2015	52,41%	58,42%
8	06/11/2015	63,24%	68,76%
9	01/12/2015	73,03%	77,77%
10	01/01/2016		
11	01/02/2016		
12	01/03/2016		

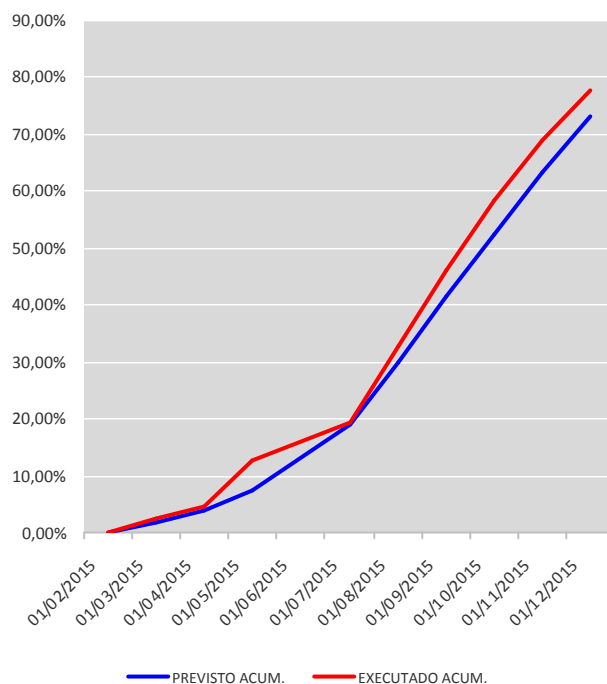



**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

3.0 FOTOGRAFIAS

a) Caixa de Esgoto



b) Revestimento em Pastilhas na parede Elevadores



c) Caixa com haste de aterramento com solda exotermica






**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

d) Instalação das Bombas de Água Fria



e) Fechamento do Perfil da Pele de Vidro

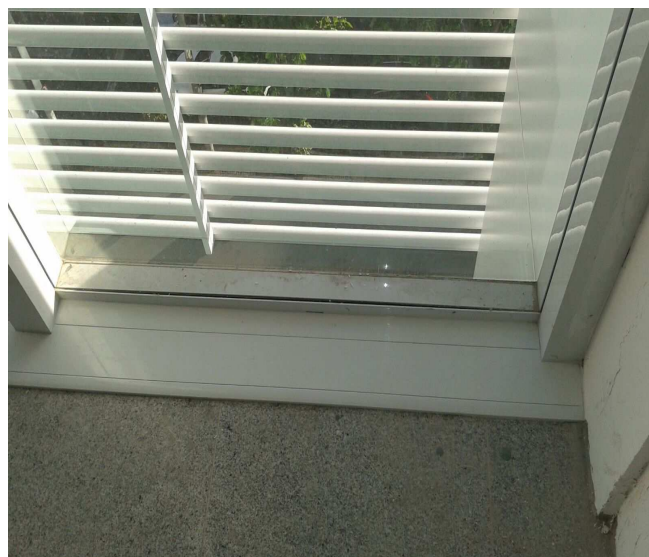

f) Instalação da Sala Técnica Térreo





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**


g) Fachada Duque de Caxias



h) Rampa de Acesso



i) Finalização das Bandeiras para Pórtico de Vidro 4º Pavimento

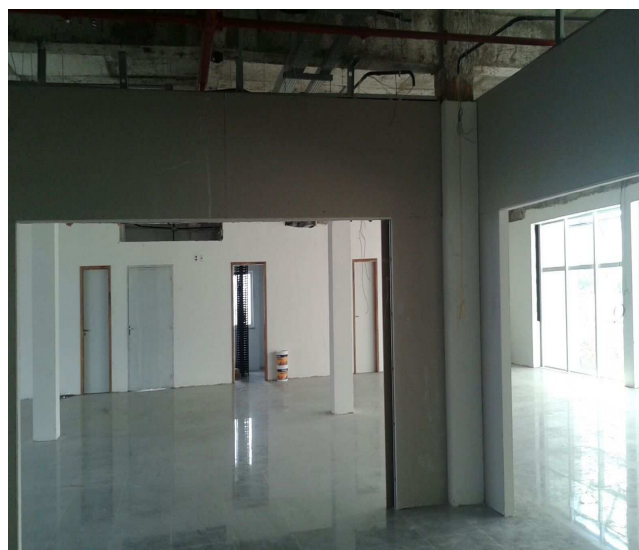




**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

j) Instalação das Janelas Sala de Ar condicionado



l) Janelas Esquadrias Térreo

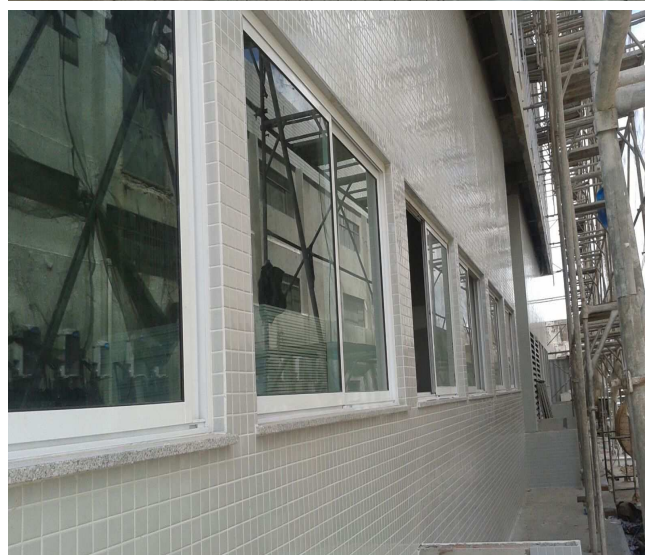

m) Balcão da Entrada do Térreo





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

o) Balcão da Entrada do Térreo



p) Calçadas externas fachada do fundo



q) Calçadas externas fachada do fundo





**OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO EDIFÍCIO
DESEMBARGADOR MANOEL ARÍZIO DE CASTRO
(FÓRUM AUTRAN NUNES)**

r) Execução da Fachada E2 (ACM)



s) Acabamento dos Perfis na Pele de Vidro

