



3º RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA FORUM AUTRAN NUNES

LOCAL: FORTALEZA-CE

UNIDADE: ED. MANOEL ARIZIO DE CASTRO

DATA: 18/03/2016

AUTOR: EDONARD RADNAI

RESP. TÉCNICO: JOSÉ ERIALDO SILVA DE MESQUITA

ENGº MECÂNICO - CREA-CE RNP 0601339231

Í N D I C E

1.0 -	OBJETIVO	pg. 03
2.0 -	VISTORIA	pg. 03
3.0 -	ASPECTOS GERAIS DA OBRA	pg. 03
4.0 -	SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	pg. 03
5.0 -	ANEXO FOTOGRÁFICO	pg.04 a 11

1.0 - OBJETIVO

Fiscalização da execução das instalações do sistema ar condicionado destinado as instalações do Fórum Autran Nunes Ed. Manoel Arizio de Castro localizado em Fortaleza-CE, em confronto com o projeto elaborado para atender aos diversos ambientes deste Edifício.

2.0 – 3ª VISTORIA

A 3ª vistoria foi realizada pelo Sr Edonard Radnai, Diretor da Radnai Ar Condicionado, empresa especializada em Projetos e Consultoria Técnica de Ar Condicionado Ventilação e Exaustão Mecânica, sob supervisão do Engenheiro Mecânico José Erialdo Silva de Mesquita.

3.0 –ASPECTOS GERAIS DA OBRA

Na presente vistoria foi observado a conformidade dos materiais e a execução dos serviços com o especificado no projeto de Climatização.

O fornecimento e a instalação dos equipamentos estão a cargo da empresa Sulamericana Engenharia Ltda aqui denominada CONTRATADA, representada na obra pelo Engº Daniel Prestes, sendo o Tribunal aqui denominado CONTRATANTE.

Os equipamentos fornecidos pelo instalador, , são similares aos projetados tanto nas características técnicas quanto em suas capacidades de refrigeração.

4.0 – SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Na fase atual 100 unidades internas estão montadas no local onde serão instaladas faltando 08 evaporadoras a serem instaladas no 5º Pavimento.


Os ventiladores de renovação de ar estão todos instalados nos locais previstos conforme no projeto.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - As unidades condensadoras deverão chegar a obra até o fim do mês conforme informou o engenheiro responsável da Contratada
 - 2 - As vedações solicitadas na cobertura das casas que abrigam os quadros elétricos foram executadas e não oferecem mais perigo aos quadros por ocasião das intempéries.
 - 3 - Fomos informados que as unidades condensadoras do Pavimento Térreo encontram-se no estado do Ceará aguardando liberação da Secretaria da Fazenda e seriam montadas no prazo de 24:00h.
-

5.0 – ANEXO FOTOGRÁFICO

Pav. Térreo –
Evaporadoras ainda não foram montadas.
Tubulação frigorífica está sendo executada.
Dutos rígidos e flexíveis de renovação de ar montados.

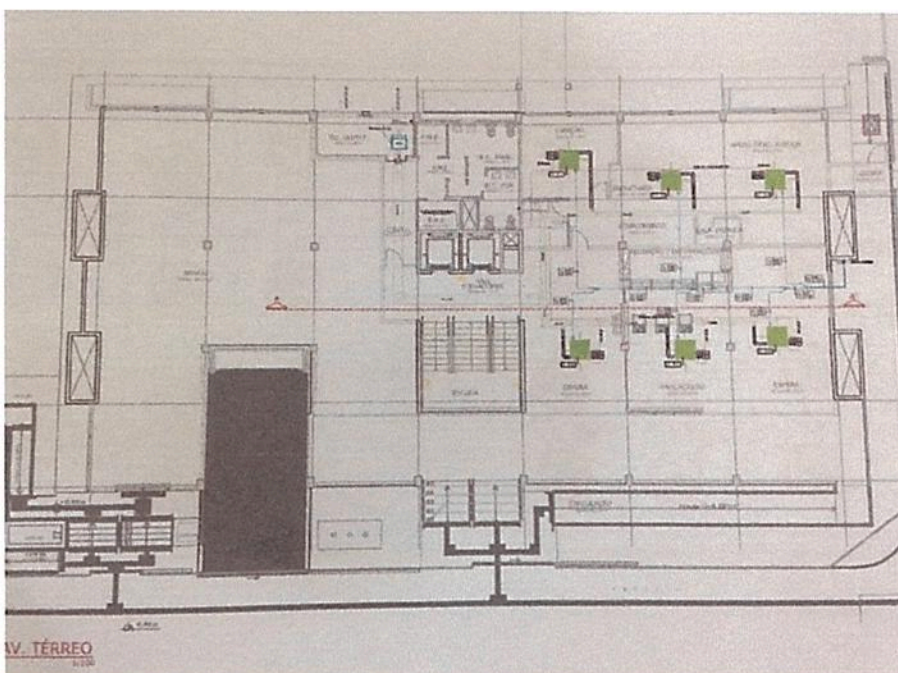


1º Pav. –

Todas as evaporadoras foram montadas inclusive as do tipo Hi Wall dos Racks;
(O forro falso em gesso já foi montado e pintado pela Construtora)

A tubulação frigorífica foi concluída e testada.

Detalhe de alçapão no forro falso para manutenção da evaporadora.

Evaporadora protegida durante a execução da pintura no forro falso.

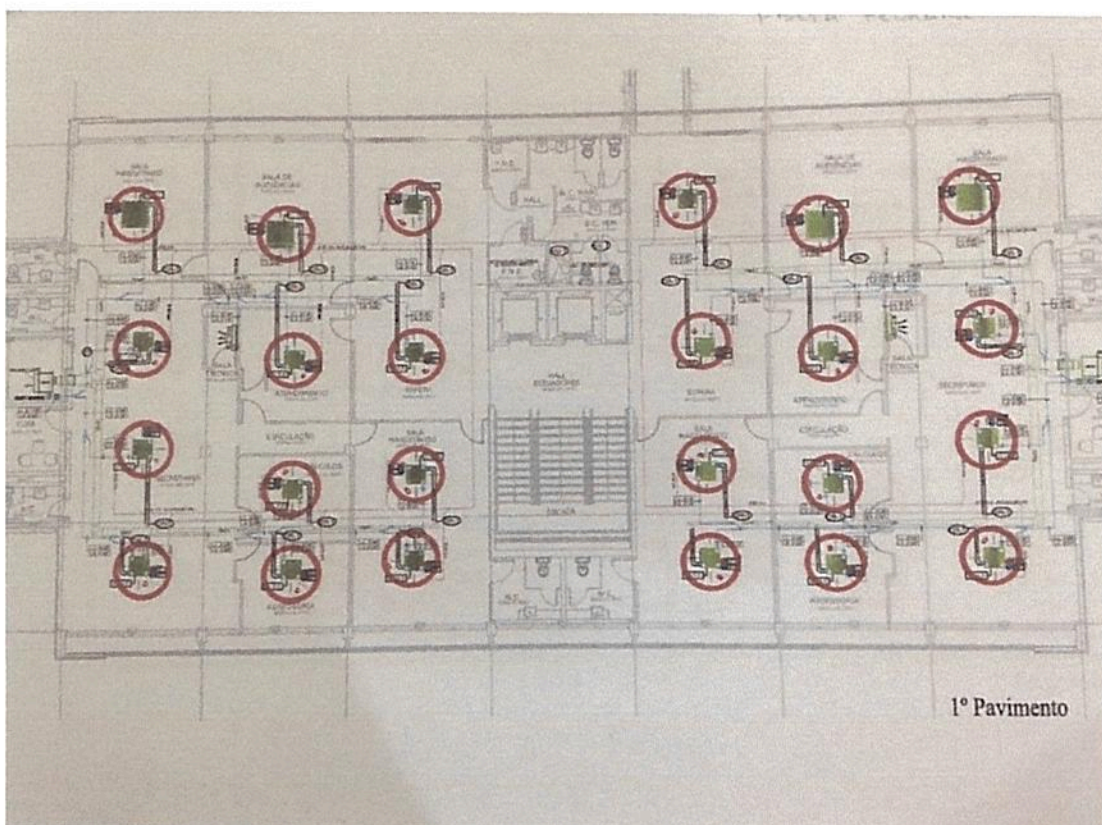


2º Pav. –

Todas as evaporadoras foram montadas inclusive as dos Racks.

A tubulação frigorífica foi concluída e testada.

Detalhe de alçapão no forro falso para manutenção da evaporadora.

Evaporadora protegida durante a execução da pintura no forro falso.

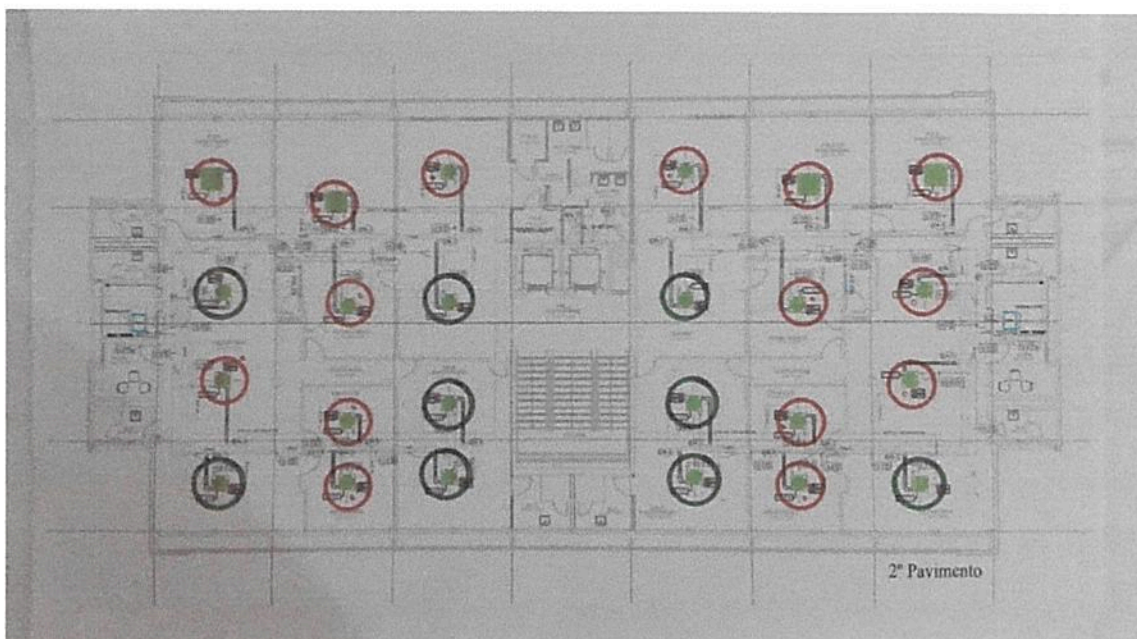

3º Pav. –

Todas as evaporadoras foram montadas inclusive as dos Racks.

A tubulação frigorífica foi concluída e testada.

Detalhe de alçapão no forro falso para manutenção da evaporadora.

Evaporadora protegida durante a execução da pintura no forro falso.

Aguardando a conclusão da pintura do forro falso para instalação da grelha da evaporadora.

