





DIAGRAMAS DA OBRA – 2ª MEDIÇÃO


PREVISTO X EXECUTADO

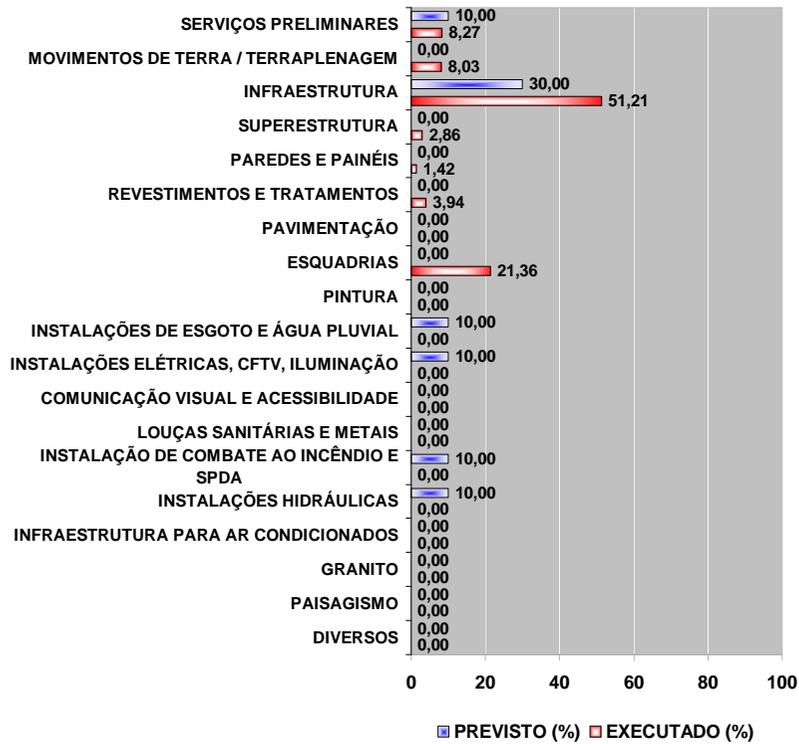

CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

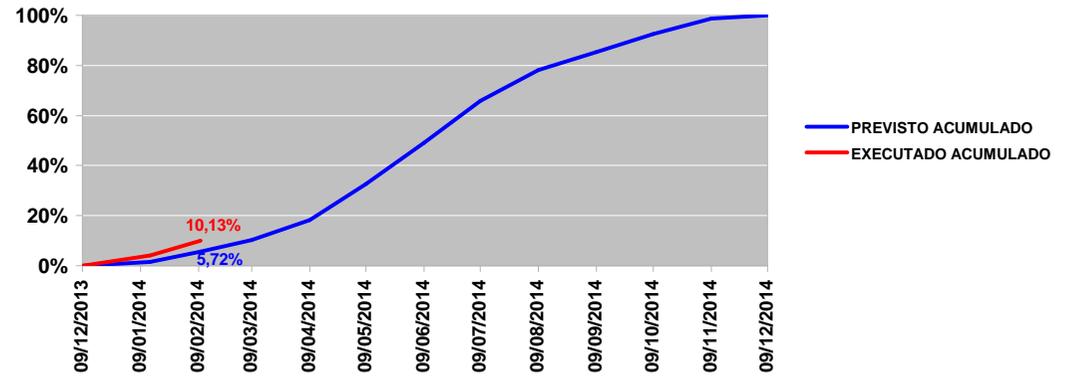

QUADRO DE EFETIVO

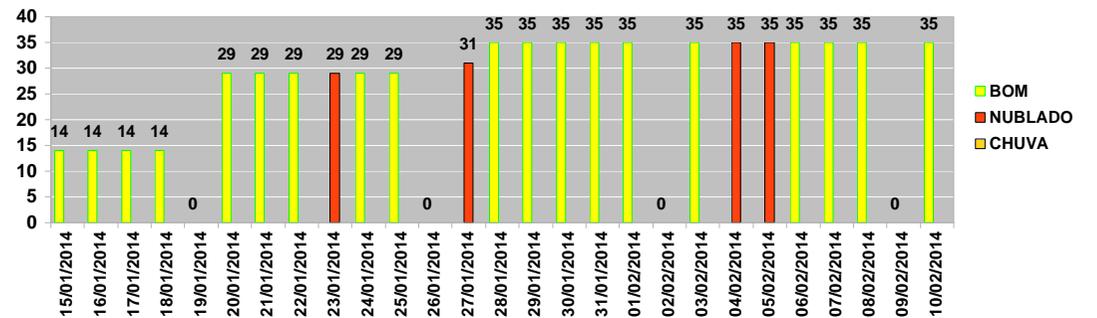



INFRAESTRUTURA DE CONCRETO





SUPERESTRUTURA DE CONCRETO





CERCAMENTO E MURO DE CONTORNO DA OBRA



13 - Fundação Muro de Contorno



14 - Alvenaria de embasamento do Gradil



15 - Gradil em tela de h = 2,43m



16 - Muro de Contorno Rebocado Internamente



17 - Muro externamente rebocado



18 - Reaterro da fundação do muro



MURO DE ARRIMO



19 - Conclusão do muro de arrimo



20 - Aterro interno do muro de arrimo



21 - Compactação do aterro manual



22 - Arrimo de reforço ao muro da Fábrica



23 - Visão frontal do arrimo do muro do vizinho



24 - Regularização mecanizada do aterro





## CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DO CARIRI



31 - Escritório da Contratada e Fiscalização



32 - Armadura das vigas da superestrutura



33 - Armaduras dos pilares do pav. Térreo



34 - Visão da Rua Raimundo Macedo da Cruz



35 - Estoque de tijolo cerâmico para alvenaria



36 - Rua Rdo Macedo responsabilidade PMJ



**ATIVIDADES RELEVANTES EM EXECUÇÃO**

- Movimento de Terra, com terraplenagem concluída, faltando apenas parte do aterro e a compactação do solo;
- Instalações Provisórias de Canteiro concluídas;
- Execução completa do Muro de Arrimo;
- Execução de 80% das fundações da obra;
- Corte, moldagem da armadura dos pilares em sua totalidade e das vigas parcialmente, itens da Superestrutura de Concreto Armado;
- Início das fôrmas das vigas da Superestrutura;
- Execução do Muro de Contorno e do Gradil de Cercamento da obra;
- Execução do reboco do muro de arrimo e do muro de contorno.

Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire  
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil Adriano Duarte Vieira  
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil Gustavo Daniel G. Monteiro  
Diretor da Divisão de Engenharia

14/2/2014
