





DIAGRAMAS DA OBRA – 3ª MEDIÇÃO


PREVISTO X EXECUTADO

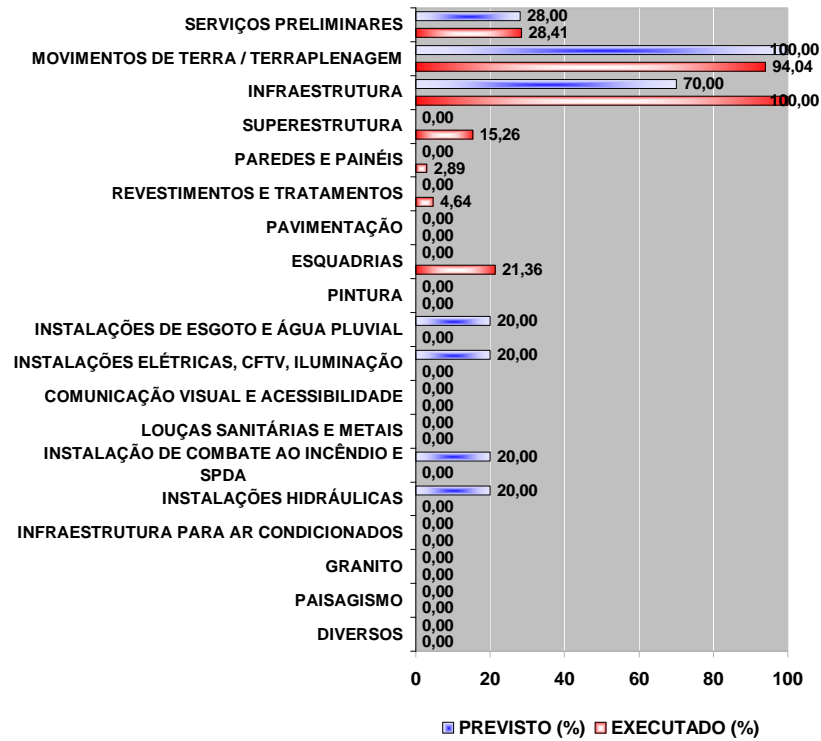

CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

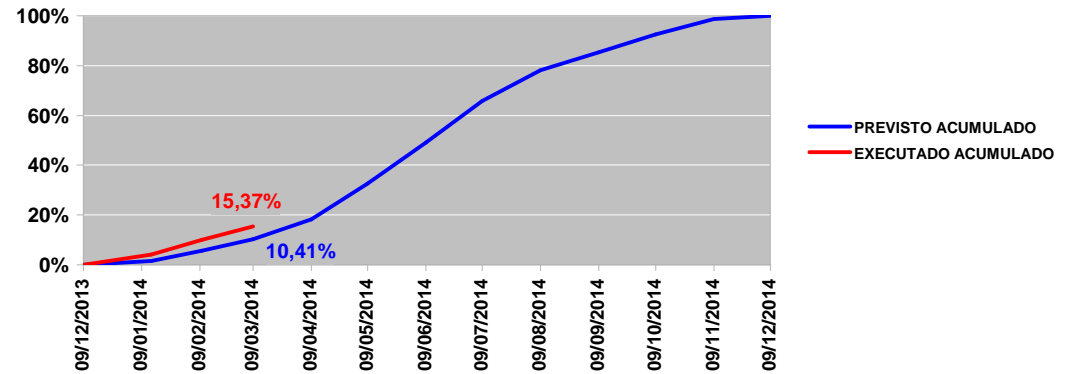

QUADRO DE EFETIVO

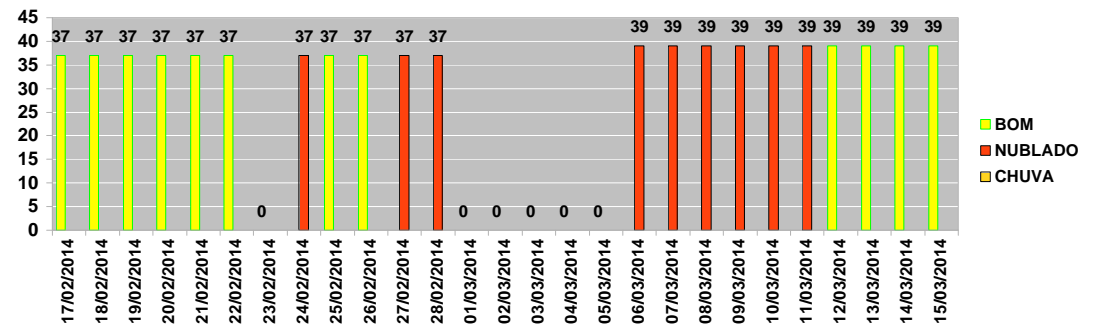



INFRAESTRUTURA DE CONCRETO





SUPERESTRUTURA DE CONCRETO







CERCAMENTO E MURO DE CONTORNO DA OBRA





MURO DE ARRIMO







CANTEIRO DE OBRAS E DIVERSOS





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO  
DIVISÃO DE ENGENHARIA  
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

## CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DO CARIRI

### ATIVIDADES RELEVANTES EM EXECUÇÃO

- Conclusão do reboco do muro de arrimo e do muro de contorno;
- Início da forma de madeira das vigas de concreto;
- Execução completa do Muro de Arrimo;
- Execução de todas as fundações da obra;
- Corte, moldagem da armadura dos pilares em sua totalidade e das vigas do pavimento Subsolo, itens da Superestrutura de Concreto Armado;
- Início do cimbramento metálico da laje nervurada do Subsolo;
- Colocação das cordoalhas de aço nas formas e armaduras das vigas de concreto e faixas de protensão da estrutura do Subsolo;
- Colocação das caixas plástica para execução das nervuras.

\_\_\_\_\_  
Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire  
Analista Judiciário TRT7

\_\_\_\_\_  
Eng. Civil Adriano Duarte Vieira  
Analista Judiciário TRT7

\_\_\_\_\_  
Eng. Civil Gustavo Daniel G. Monteiro  
Diretor da Divisão de Engenharia

**20/3/2014**
