





DIAGRAMAS DA OBRA – 9ª MEDIÇÃO


PREVISTO X EXECUTADO

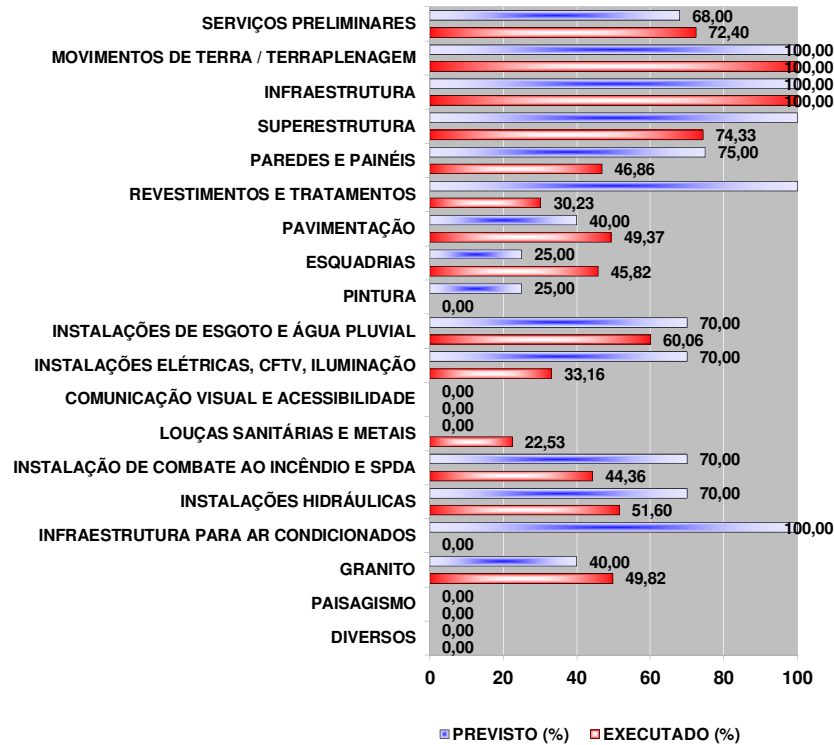

CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

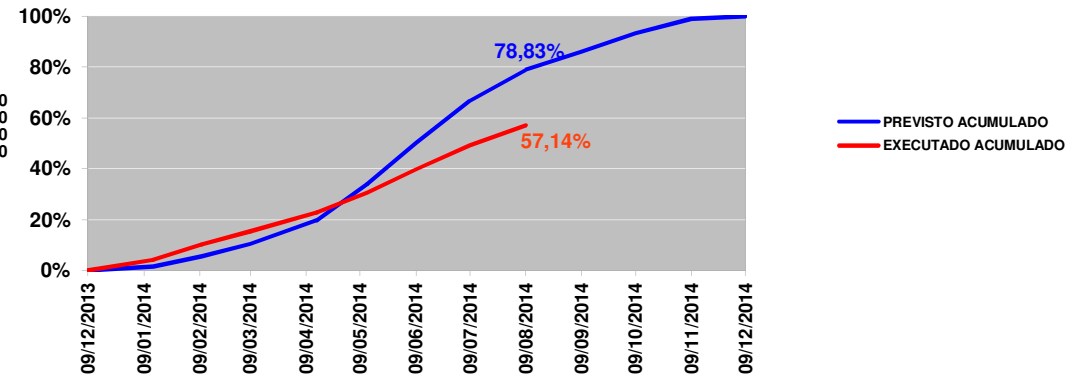

QUADRO DE EFETIVO

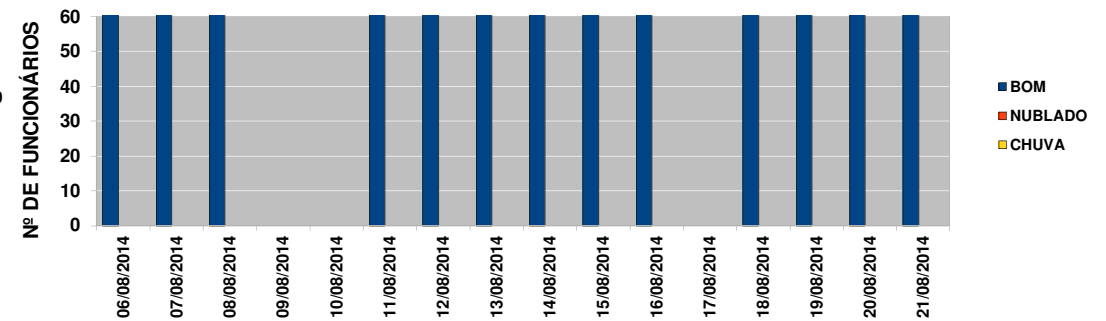



SUPERESTRUTURA DE CONCRETO





REVESTIMENTOS



7 - RETIRADA DAS SOBRAS CORDOALHAS



8 - REVESTIMENTO CERÂMICO DO TÉRREO



9 - ASSENTAMENTO DE BANCADAS



10 - PORCELANATO NA 2ª VARA



11 - PORCELANATO NA 3ª VARA



12 - ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS



PISO INTERTRAVADO DO SUBSOLO E COMBOGÓ







25 - INSTALAÇÃO COMBATE INCENDIO



26 - CONCLUSÃO REBOCO EXTERNO



27 - EXECUÇÃO DA GUARITA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE ENGENHARIA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DO CARIRI

ATIVIDADES RELEVANTES EM EXECUÇÃO

- A superestrutura no pavimento Térreo está em conclusão;
- A cobertura metálica está concluída, aguardando o telhamento de telha dupla de alumínio com preenchimento de poliuretano;
- Esquadrias de alumínio e vidro foram iniciadas;
- Está em conclusão as alvenarias do Pavimento Térreo;
- Teve início a instalação elétrica, hidráulica, sanitária e de drenagem pluvial no pavimento Térreo;
- O reboco interno e externo estão em conclusão;
- Foi iniciado o assentamento do porcelanato das Varas de Trabalho e a cerâmica do Térreo;

Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil Adriano Duarte Vieira
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil Gustavo Daniel G. Monteiro
Diretor da Divisão de Engenharia

22/08/2014
