





DIAGRAMAS DA OBRA – 10ª MEDIÇÃO


PREVISTO X EXECUTADO

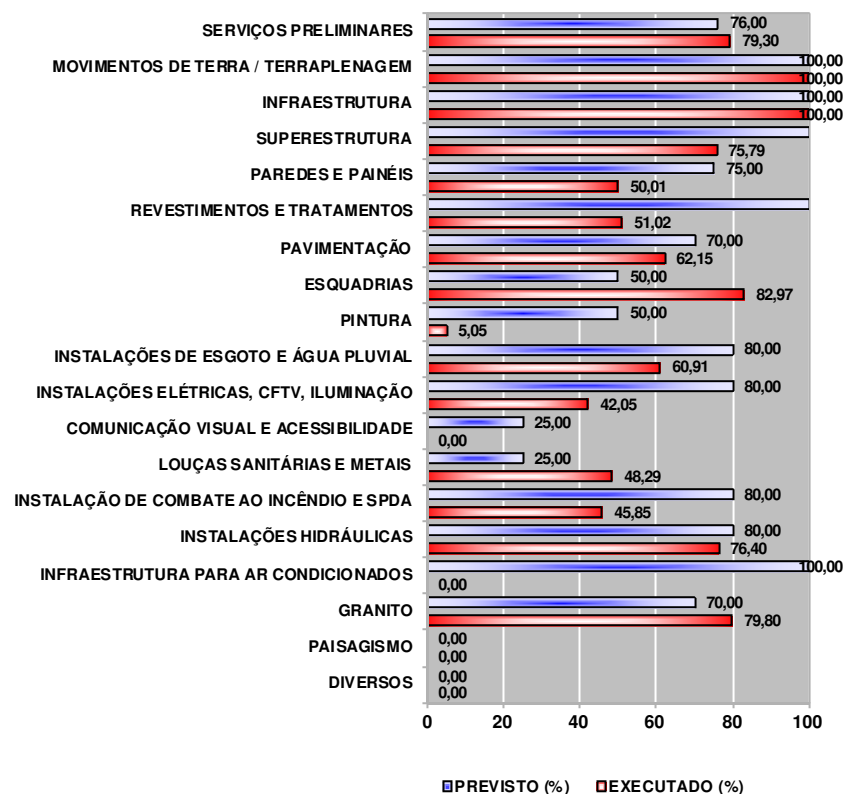

CURVA DE PROGRESSO FÍSICO



QUADRO DE EFETIVO















ATIVIDADES RELEVANTES EM EXECUÇÃO

- A superestrutura no pavimento Térreo está concluída;
- Foi iniciada a fixação das treliças da cobertura metálica;
- Foram assentados os corrimões da escada metálica e da rampa de acesso;
- Foram concluídas as alvenarias e revestimentos da obra;
- Fiação em conclusão e finalização das tubulações elétricas, telefônicas, hidráulicas e sanitárias;
- Foram concluídas as esquadrias de alumínio;
- O porcelanato e a cerâmica (Revestimento Interno) encontra-se em mais de 50% de sua área executada;
- O ACM da fachada foi iniciado;

PENDÊNCIAS E COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

- Solicitamos a CMB Engenharia iniciar o telhamento da cobertura metálica;
- Solicitamos a retirada da obra de material de descarte como resto de madeira, seguindo a legislação ambiental vigente;;
- Recomendamos que sejam corrigidas todas as peças de concreto que apresentaram vazios e rebarbas;
- Informamos a necessidade de uma maior atenção as normas de segurança do trabalho, quanto aos equipamentos de proteção coletiva;

Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil Adriano Duarte Vieira
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil Gustavo Daniel G. Monteiro
Diretor da Divisão de Engenharia

26/09/2014
