





DIAGRAMAS DA OBRA – 12ª MEDIÇÃO


PREVISTO X EXECUTADO

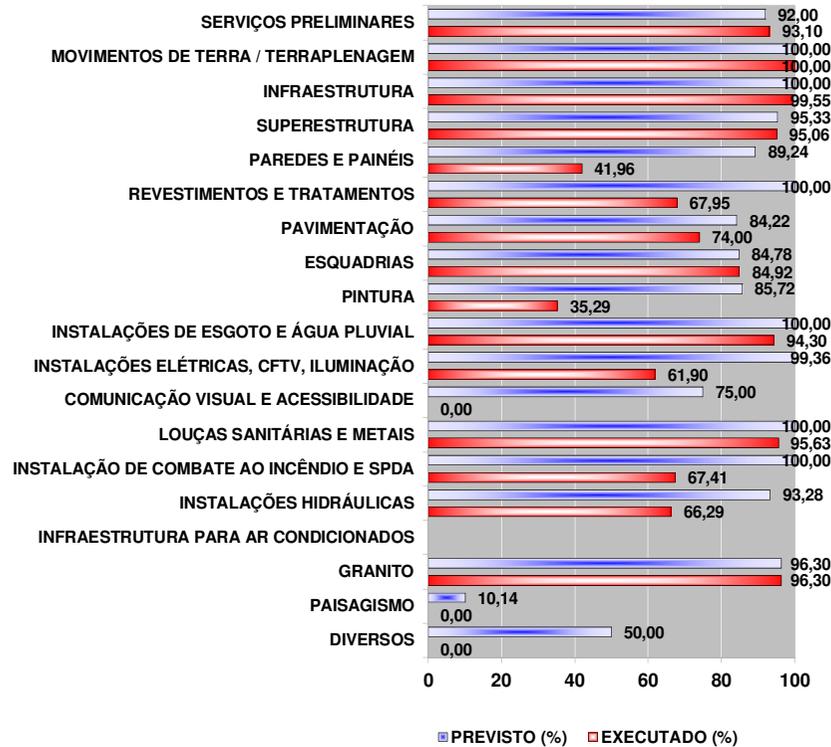


CURVA DE PROGRESSO FÍSICO

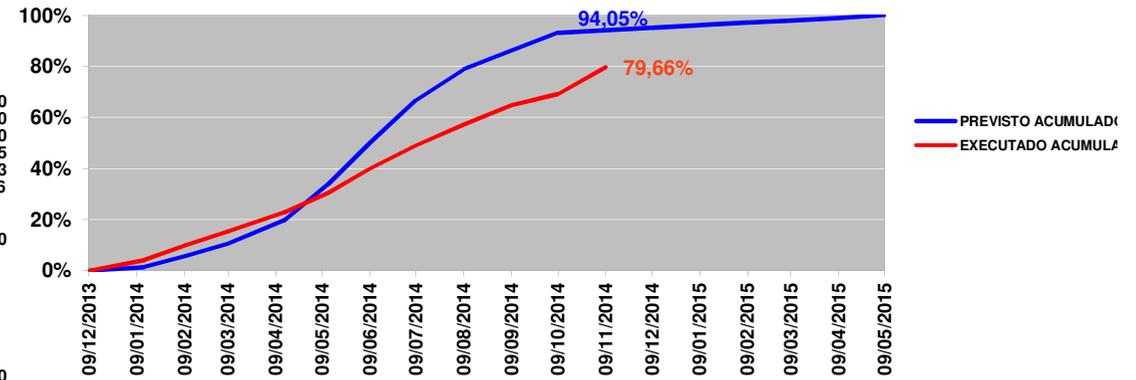

QUADRO DE EFETIVO

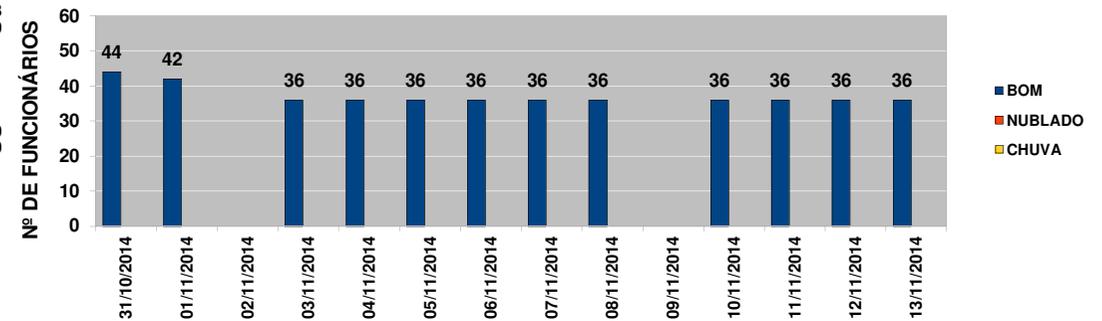



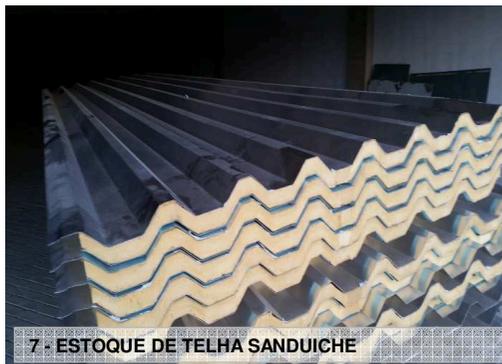

7 - ESTOQUE DE TELHA SANDUICHE



8 - EXECUÇÃO DE JARRERIRAS ATRIO



9 - DUTOS DE VENTILAÇÃO DO ÁTRIO



10 - ASSENTAMENTO DE LOUÇAS/METAIS



11 - BANCADAS DE GRANITO



12 - COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS

13/11/2014





19 - ESQUADRIAS DE ALUMINIO



20 - CORRIMÃO DAS ESCADAS



21 - EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELETRICA



22 - COLOCAÇÃO TRANSFORMADOR



23 - PASSEIO INTERNO DO FÓRUM



24 - CONCLUSÃO DO FECHAMENTO





ATIVIDADES RELEVANTES EM EXECUÇÃO

- Facha em ACM na cor Champagne está concluída;
- AS divisórias de boxes, as bancadas de banheiro e copas são todas concluídas, faltando apenas os tampos em granito no Átrio Principal;
- Coberta metálica em avançado estado de conclusão;
- Fornecimento e instalação das bombas de recalque de combate a incêndio;
- Todos os guarda-corpos da obra foram instalados;
- As esquadrias de alumínio estão em conclusão;
- Todo o piso porcelanato das varas foi concluído, restando apenas a conclusão do piso do Átrio;

Eng. Civil Paulo Brasileiro Pires Freire
Analista Judiciário TRT7

Eng. Civil John Kennedy V. de Araújo
Técnico Judiciário TRT7

Eng. Civil Gustavo Daniel G. Monteiro
Diretor da Divisão de Engenharia

13/11/2014
